工事名：Ｒ４東関道ため池橋下部工事

計　画　工　程　表（共　有）（第2回変更）

工期									
	自	：	令	和	4	年	9	月	13	日
	至	：	令	和	5	年	8	月	31	日
【第1回変更】	至	：	令	和	5	年	9	月	29	日
【第2回変更】	至	：	令	和	5	年	10	月	31	日

工　種	種別	単位	数量	請負比率	区分
橋梁下部		式	1	100%	
準備工		式	1		計画
					実施
RC橋脚工		式	1	29.41%	計画
					実施
作業土工		式	1	0.72%	計画
					実施
場所打杭	杭径1200mm　杭長（設計長）25m	本	15.0	18.99%	計画
					実施
橋台躯体工		式	1	9.68%	計画
					実施
銘板工		式	1	0.02%	計画
					実施
仮設工		式	1	56.62%	計画
					実施
仮橋・仮桟橋工		式	1	52.65%	計画
					実施
土留・仮締切工	III型 鋼矢板長さ9m 鋼矢板打込長9m以下 鋼矢板引抜長9m以下	枚	160	2.46%	計画
					実施
作業ヤード		式	1	1.23%	計画
					実施
交通管理工		式	1	0.28%	計画
					実施
共通仮設工		式	1	13.97%	計画
					実施
後片付け		式	1		計画
					実施

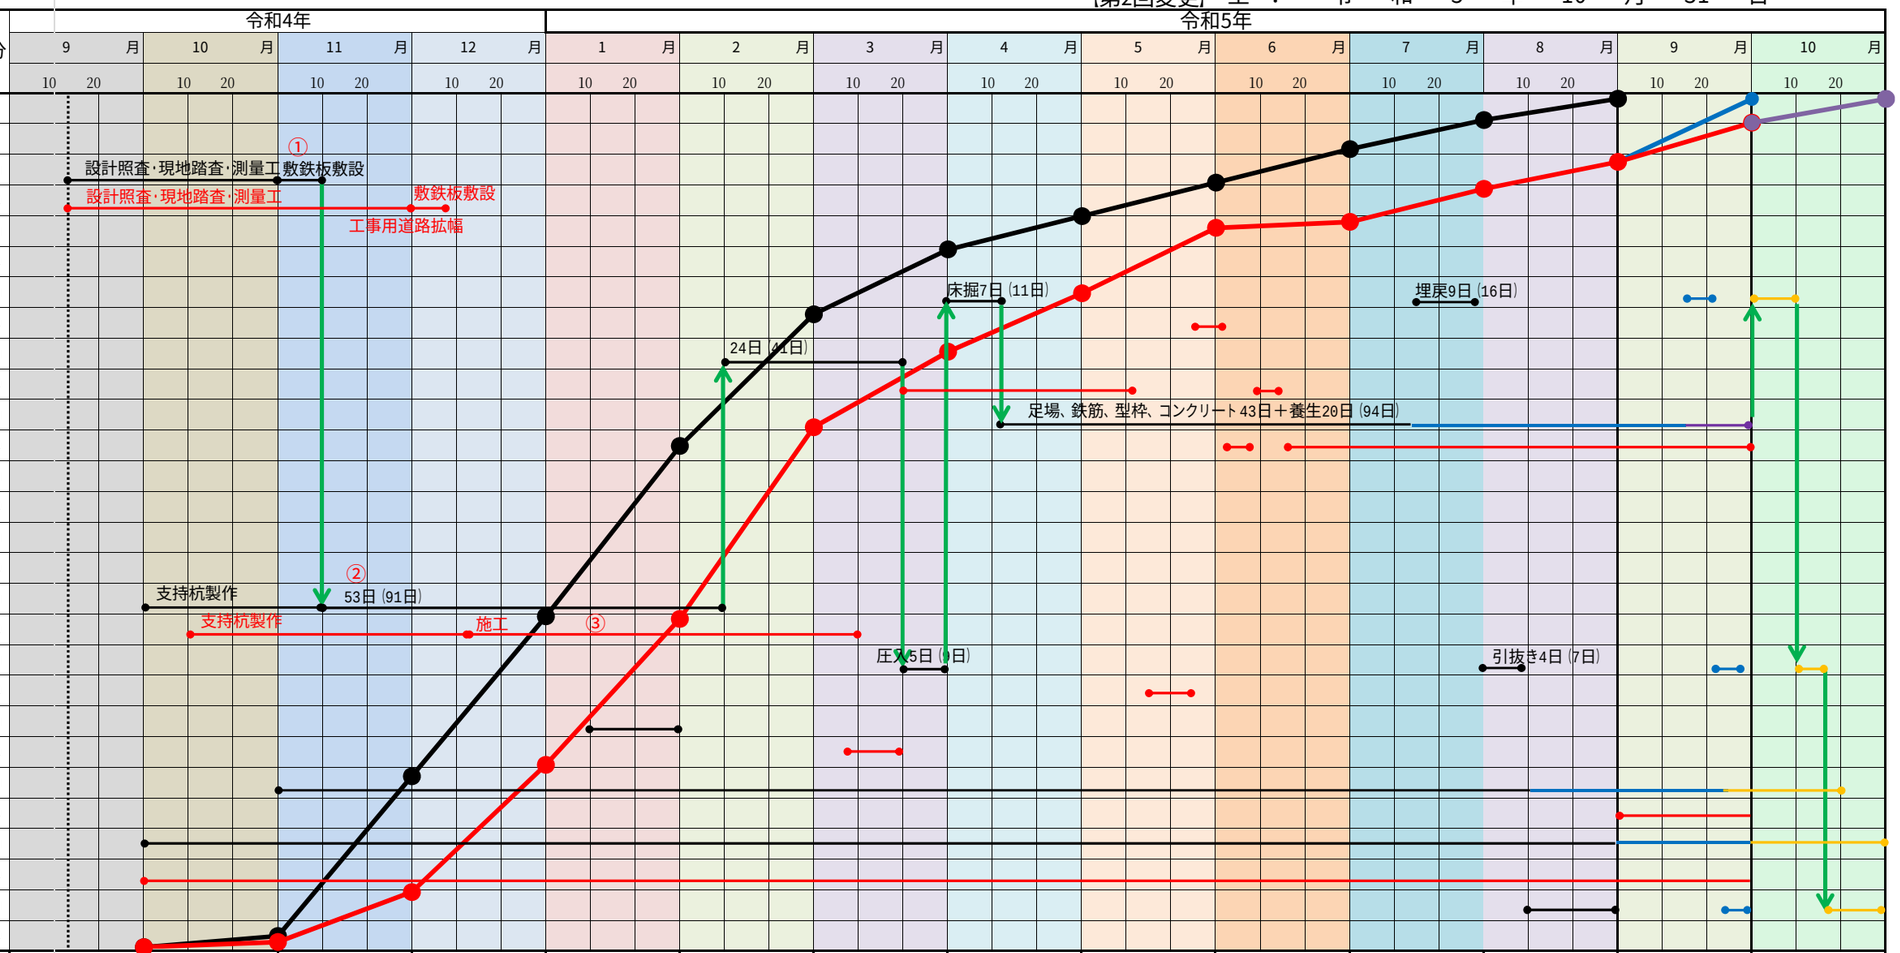

	当初	第1回変更	第2回変更	実施
9 月	0.0%			0.0%
10 月	1.3%			0.6%
11 月	20.2%			6.5%
12 月	39.0%			21.5%
1 月	59.1%			38.7%
2 月	74.6%			61.3%
3 月	82.3%			70.2%
4 月	86.2%			77.1%
5 月	90.1%			84.8%
6 月	94.1%			85.5%
7 月	97.5%			89.4%
8 月	100.0%	92.6%	92.6%	92.6%
9 月		100.0%	97.2%	97.2%
10 月			100.0%	
			8/23 第1回変更	9/27 第2回変更

※工程表内の日数は稼働日数（不稼働率考慮日数）を示す

クリティカルパス
