


工事名：R4東関道ため池橋下部工事

# 計画工程表(共有)(第1回変更)

工期 自：令和4年9月13日  
 至：令和5年8月31日  
 [変更] 至：令和5年9月29日

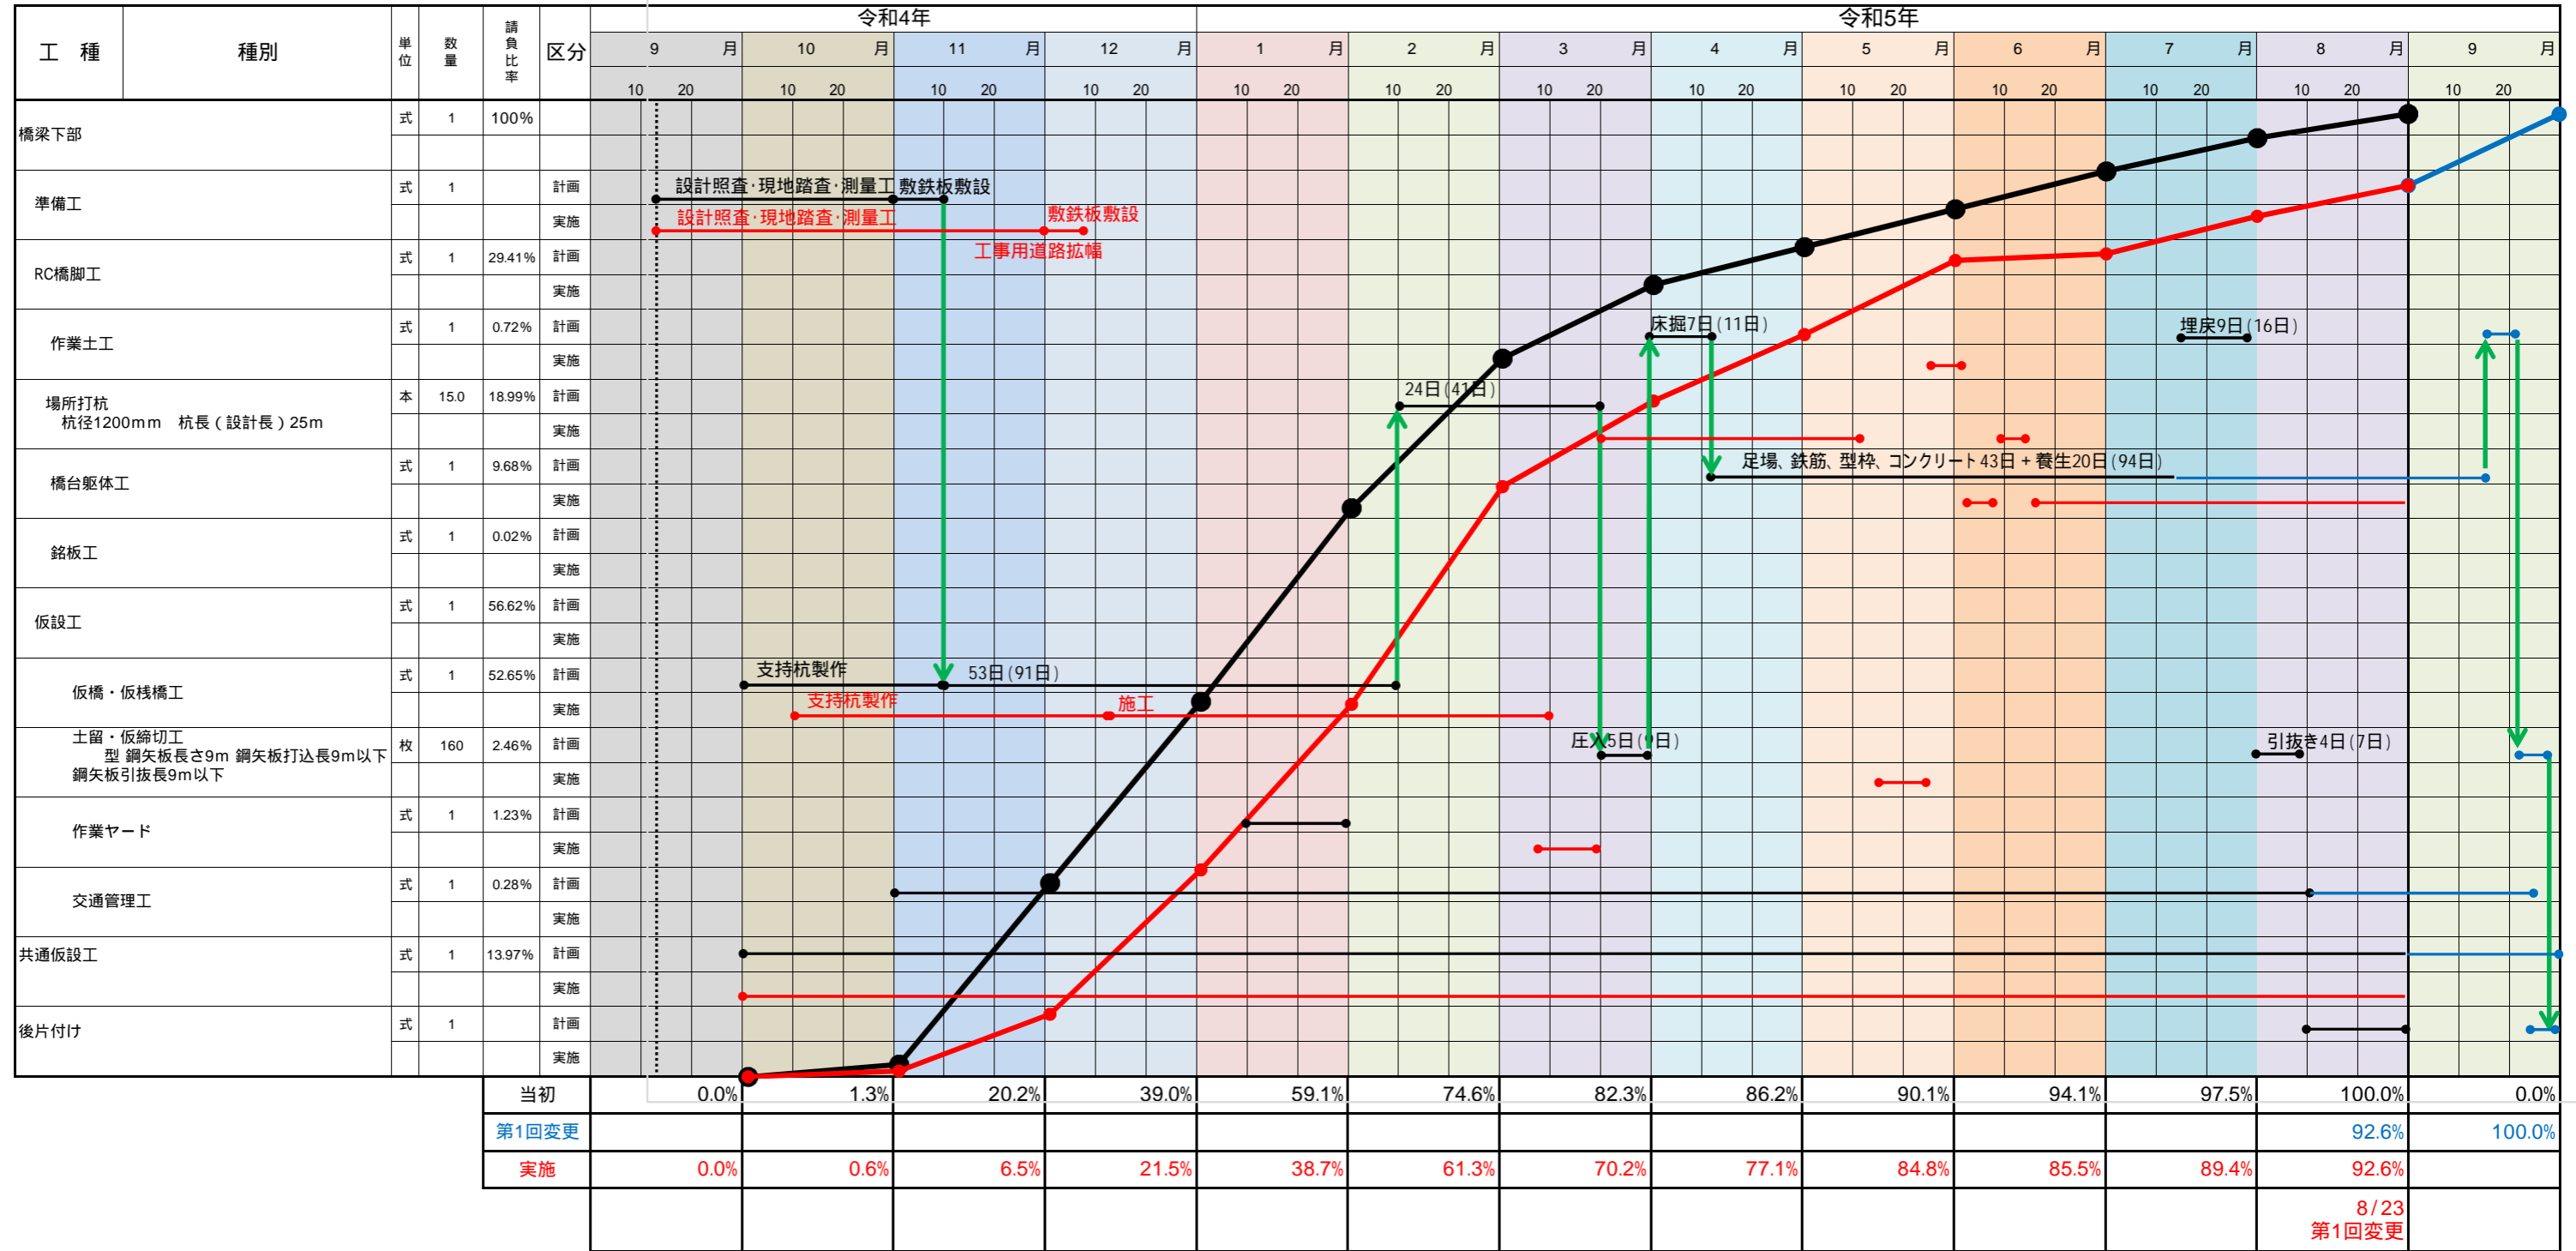

工程影響事項

工程表内の日数は稼働日数(不稼働率考慮日数)を示す

No.	項目	内容	条件明示
	工事用道路の通行について	11月から工事用道路が通行できる状態が必要である。	特記第101条 工事用道路
	仮橋材料について	鋼材の材料不足による材料の納期の遅延が考えられる。	特記第50条 工事工程クリティカルパスの共有
	仮橋増工について	仮橋増工に伴い、施工日数の増が必要である。	特記第50条 工事工程クリティカルパスの共有

クリティカルパス

